

Untitled Gantt Project

14.3.2024

<http://>

Projektový manažer

Dny počátku/konce projektu

15.3.2024 - 18.6.2024

Dokončení

0%

Úkoly

18

Zdroje

0

Úkoly

Jméno	Datum začátku	Datum ukončení	Trvání
Výzva a trvání VŘ do podání CN	15.3.24	24.3.24	10
Výběr zhotovitele a podklad do RM	25.3.24	25.3.24	1
RADA MĚSTA	10.4.24	10.4.24	0
Podpis Sod	2.4.24	5.4.24	4
Dodací lhůta pro dveře a obložení Coco Bolo	15.3.24	4.6.24	82
Stavba HSV +PSV	4.5.24	12.6.24	40
GZS , protiprašná stěna	4.5.24	5.5.24	2
Bourací práce, odstranění koberce, průrazy pro TZB	6.5.24	10.5.24	5
Zazdívání otvorů po prosklenných stěnách	11.5.24	12.5.24	2
SDK konstrukce + jednostranné zaklopení+ montáž dv. pouzder	11.5.24	16.5.24	6
Rozvody ZTI, EI v SDK konstrukcích, úprava připojení radiátoru	16.5.24	20.5.24	5
Omítka zazdívek a příprava podkladu pro truhlářské kce	17.5.24	20.5.24	4
SDK izolace, zaklopení druhé strany a finální úpravy SDK, výmalby	21.5.24	30.5.24	10
Podlahová stěrka+ VINYL podlaha	31.5.24	4.6.24	5
Truhlářské práce - dodávka obložení a dveří	5.6.24	11.6.24	7
KOMPLETACE ZTI, EI,SLP	5.6.24	8.6.24	4
Předání a převzetí stavby	12.6.24	12.6.24	1
Interiery	13.6.24	17.6.24	5

Ganttův diagram

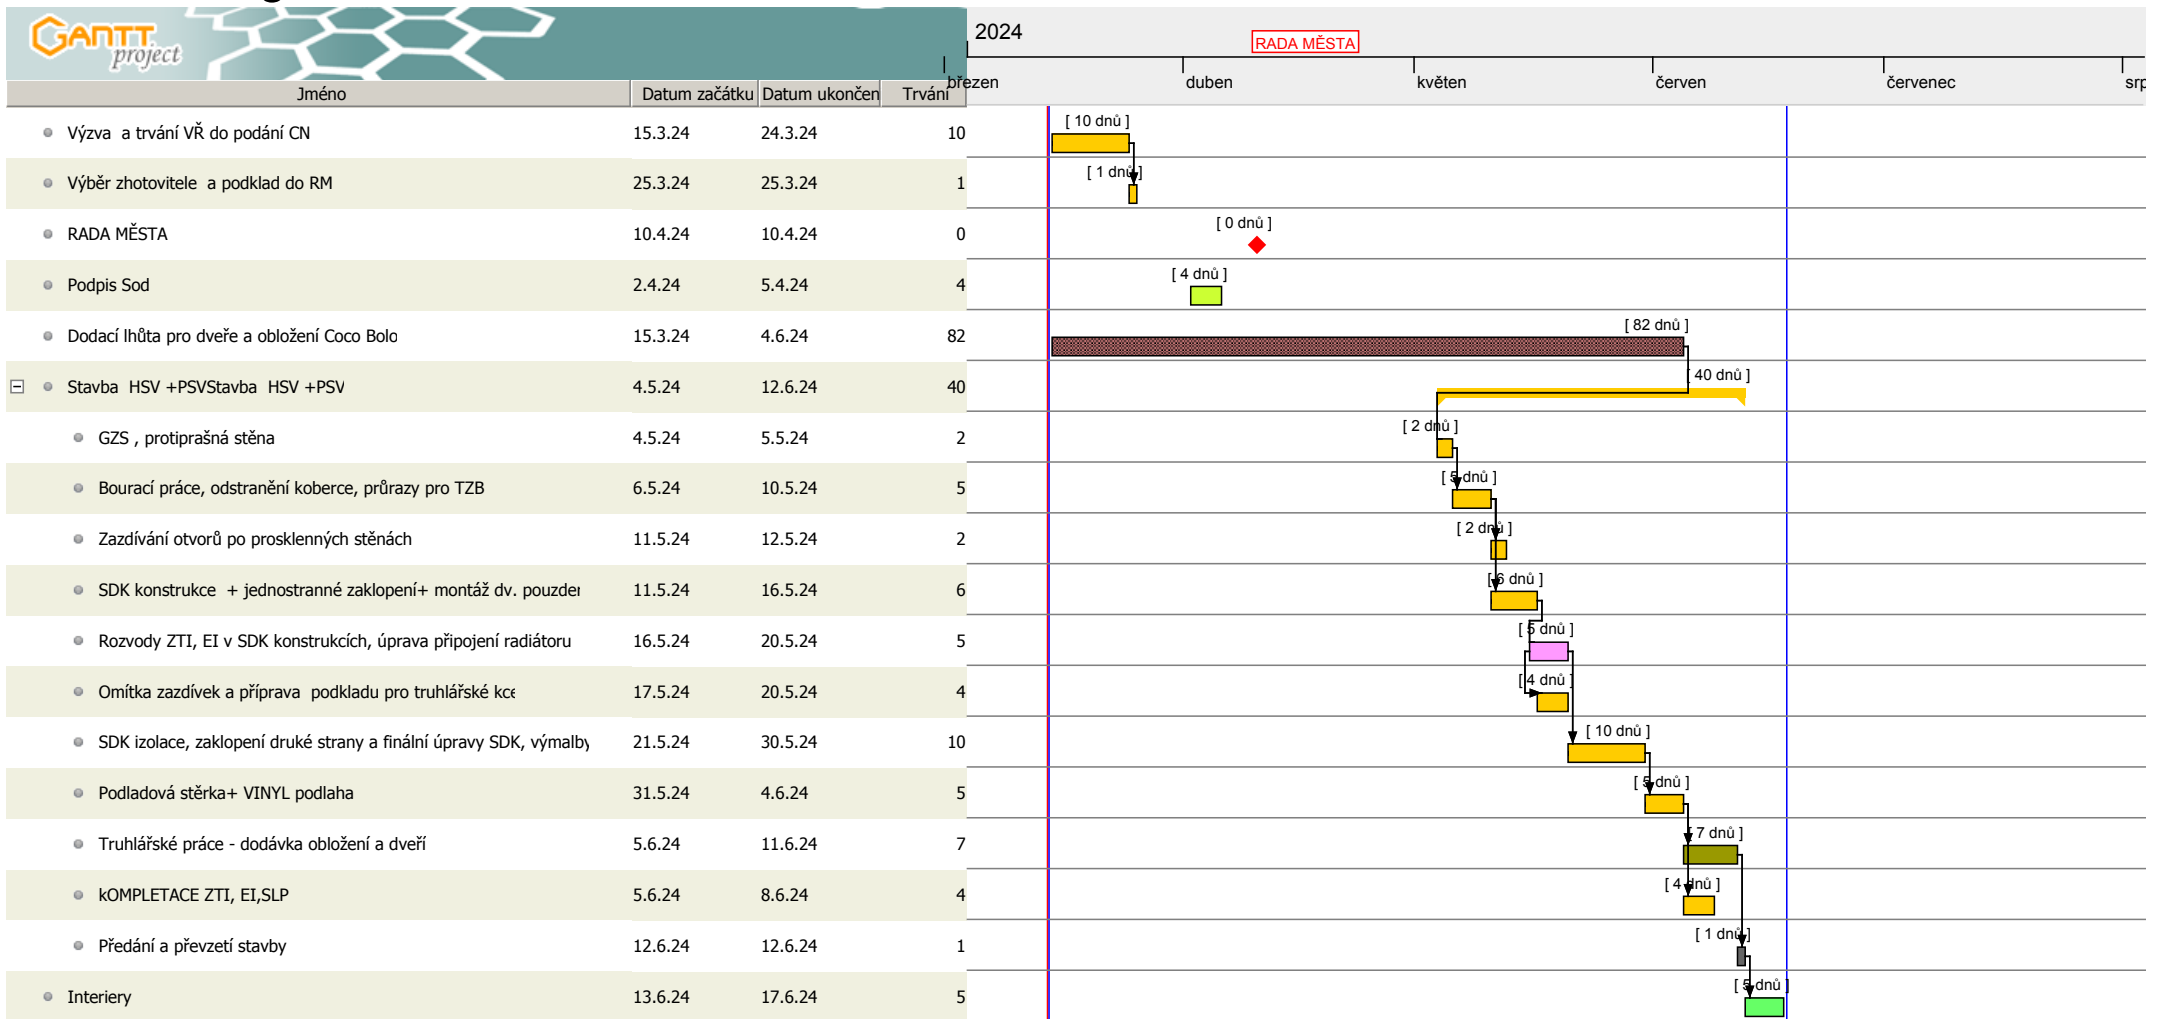


Diagram zdrojů

