



ÚSEK č.1

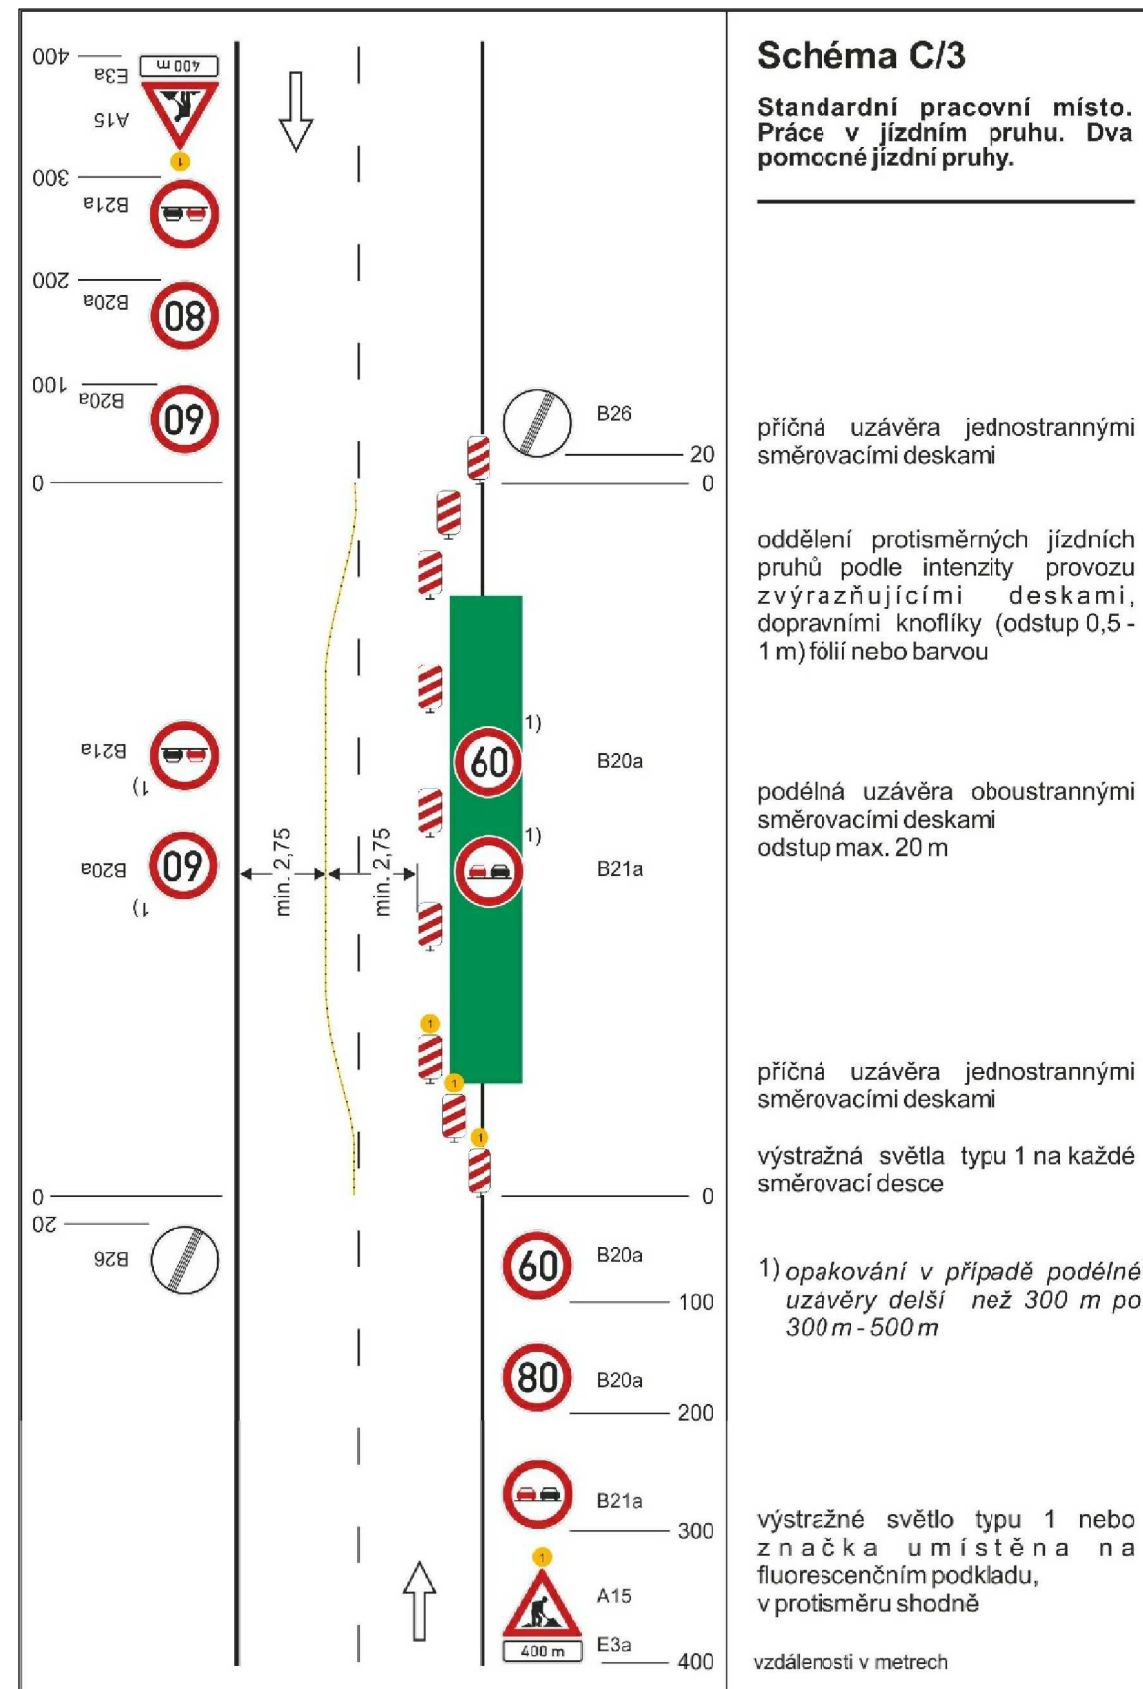

POZNÁMKA:

DIO dle schéma C/3 bude použito při stavbě úseku č.1., předpokládaná doba čini 5 týdnů.
Je uvažováno, že ze svodidla budou dočasně odmontovány svodnice, sloupky budou ponechány. Po provedení
1. úseku budou svodnice namontovány zpět.
Pro zajištění staveništní dopravy je uvažováno, že podél okraje silnice bude vyhrazen pruh v š. 2 m a provoz
bude usměrněn dle schéma.

ÚSEK č.2

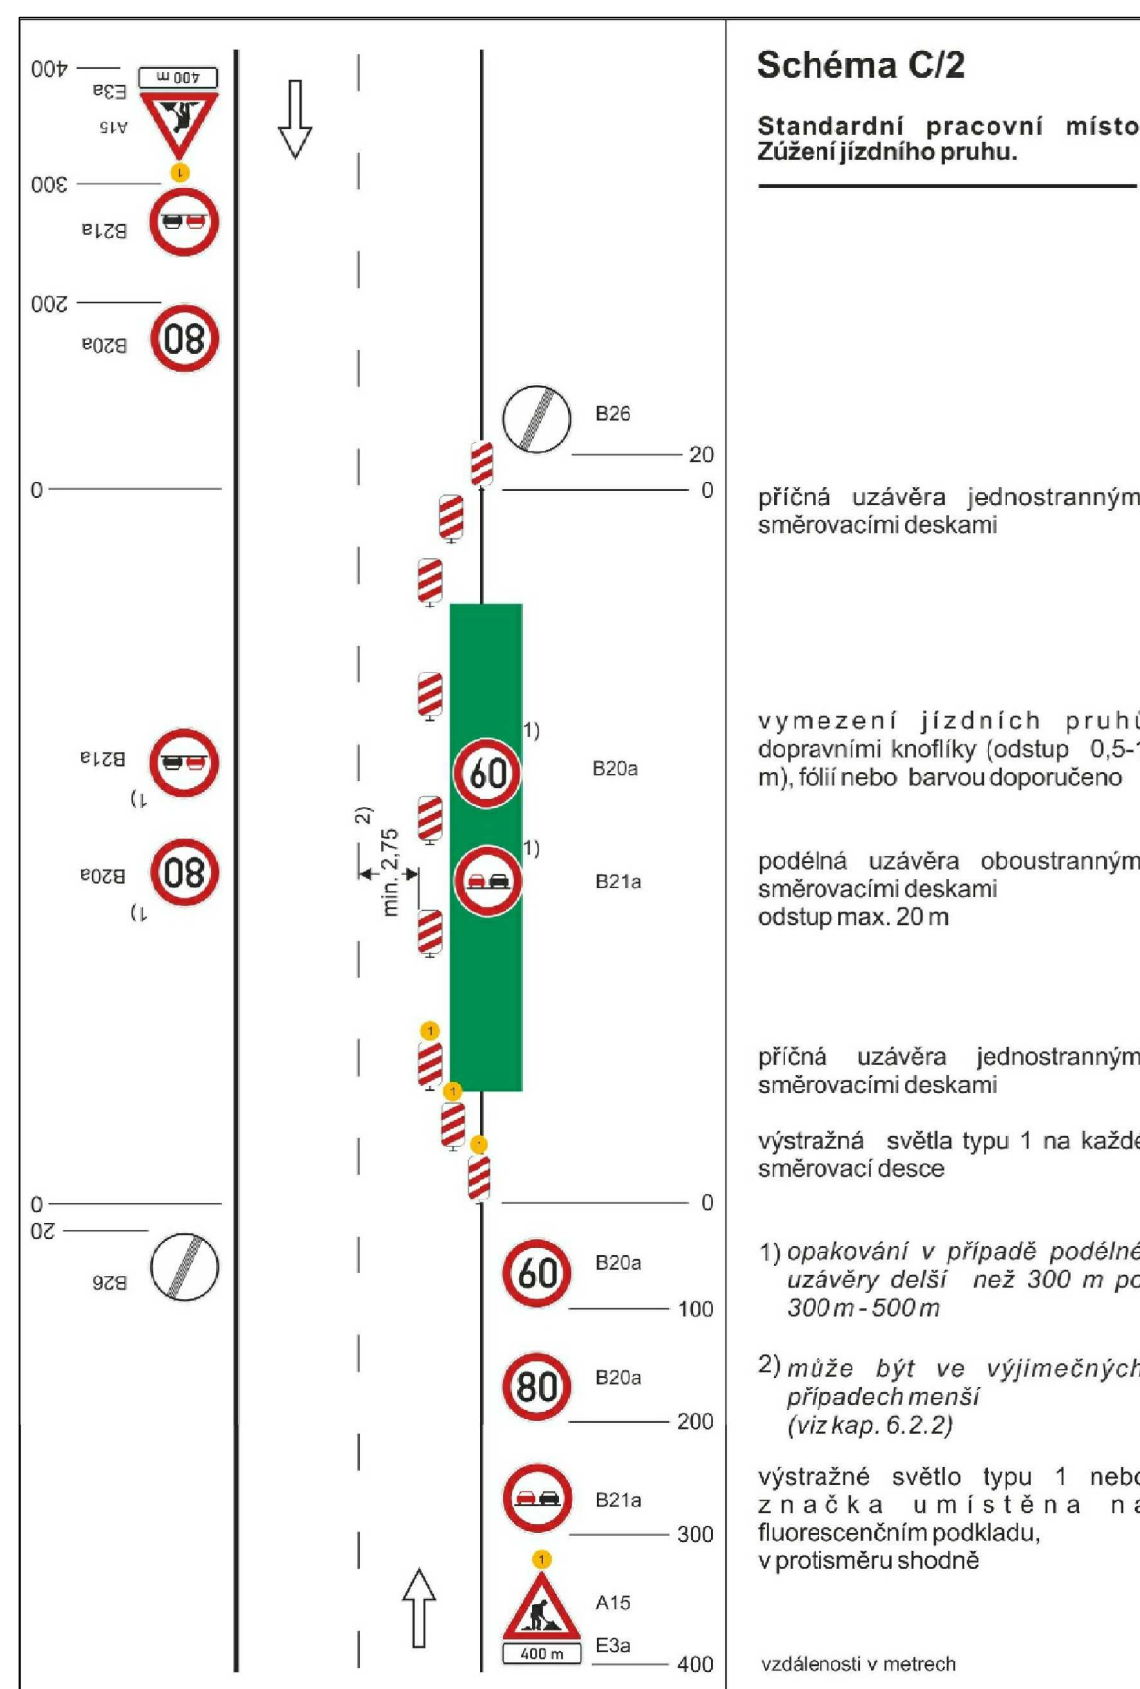




POZNÁMKA:

DIO dle schéma C/2 bude použito při stavbě části úseku č.2., předpokládaná doba činí 1 týden.
Jedná se o dobu, po kterou bude probíhat napojení nové stezky na stávající chodník na KÚ včetně osazení obrubníků podél okraje silnice I/34.



LEGENDA:

 MÍSTO STAVBY

	Ing. František Stráský - ATELIER S I S, U Maše 20, 370 01 České Budějovice		
	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Stráský František	
	VYPRACOVAL	Lavička Jaroslav	
	KONTROLOVAL	Ing. Stráský František	

Kraj:	JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	21021
Kat. území:	STARÁ HLÍNA 753726	Čís. akce:	21021-11,71
Objednatel:	MĚSTO TŘEBOŇ	Datum:	02/2022
Stavba:		Formát:	3xA4
STEZKA NOVÁ HLÍNA - STARÁ HLÍNA		Měřítko:	
		Stupeň:	Souprava:
		PDPS	
Príloha:	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Část:	Čís. přílohy:
		B8	3.
