

Untitled Gantt Project

23.11.2023

SLT

<http://>

Projektový manažer

Dny počátku/konce projektu

18.12.2023 - 19.12.2024

Dokončení

0%

Úkoly

18

Zdroje

0

Oprava slatinných koupelen ve dvou krocích:

1. Soutěž o grafický návrh a realizaci opravy 2 vzorových koupelen

2. Soutěž o realizaci opravy 16 koupelen dle 1 vybrané varianty ze dvou vzporových

Úkoly

2

Jméno	Datum začátku	Datum ukončení	Trvání
I. ETAPA - oprava 5-ti koupelen kompet	18.12.23	25.1.24	26
Demontáže a bourání + vytvoření nadpraží SDK	18.12.23	21.12.23	4
Obkladačské práce	22.12.23	12.1.24	13
Dodávka a montáž podhledu, světel, Zařiz př.	10.1.24	16.1.24	5
Podlahová stěrka	17.1.24	23.1.24	5
Dodávka a montáž sklen. dveří	24.1.24	25.1.24	2
II.ETAPA - oprava 5-ti koupelen kompet	26.1.24	23.2.24	21
Demontáže a bourání + vytvoření nadpraží SDK	26.1.24	31.1.24	4
Obkladačské práce	1.2.24	12.2.24	8
Dodávka a montáž podhledu, světel, Zařiz př.	7.2.24	13.2.24	5
Podlahová stěrka	14.2.24	20.2.24	5
Dodávka a montáž sklen. dveří	21.2.24	23.2.24	3
III.ETAPA - oprava 6-ti koupelen kompet	14.11.24	18.12.24	25
Demontáže a bourání + vytvoření nadpraží SDK	14.11.24	19.11.24	4
Obkladačské práce	20.11.24	3.12.24	10
Dodávka a montáž podhledu, světel, Zařiz př.	29.11.24	6.12.24	6
Podlahová stěrka	9.12.24	13.12.24	5
Dodávka a montáž sklen. dveří	16.12.24	18.12.24	3

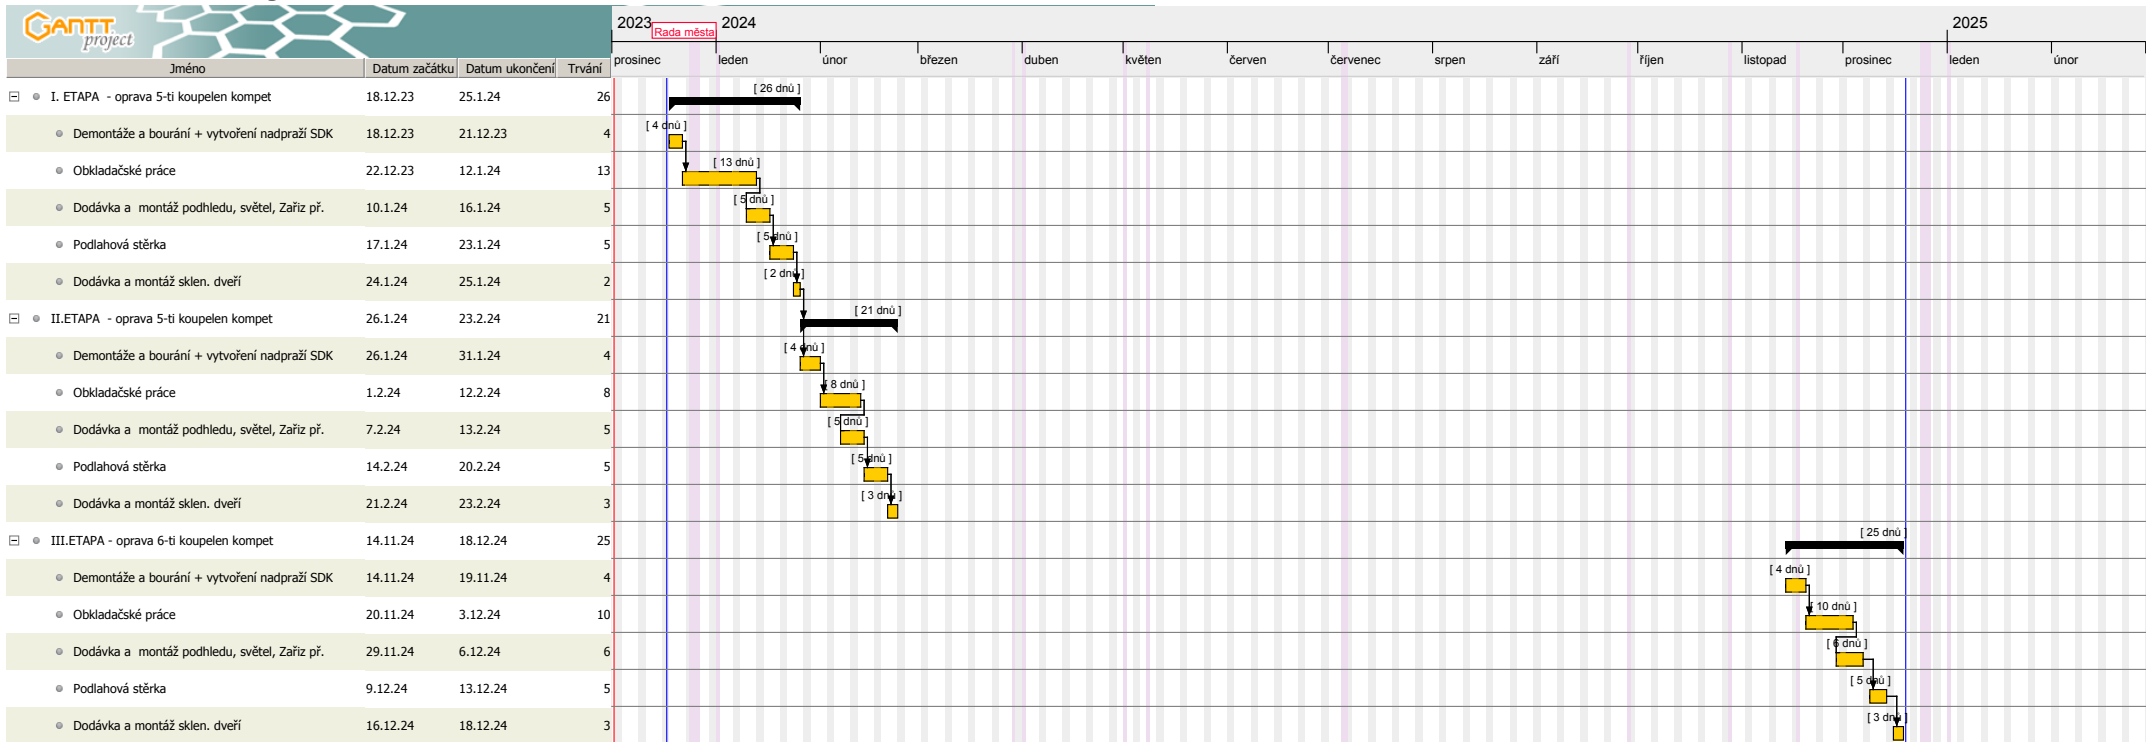


Diagram zdrojů

